（管理番号）
ECBS40

動作確認チェックシート

責任者	検査担当者
川上	穂刈

検査日	2013年　5月　11日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ソーラシミュレータ	電源電圧	3相　200V 100V	付属品①	IV測定システム
型式	YSS－400	周波数	（50 ・ 60）Hz	付属品②	チラー
メーカー名	山下電装㈱	ランプ電力	5Kw		
機械Ser,No	2010-094A				
製造年月	2010年　月				

備考（動作確認内容・不具合内容等）

【ソーラシミュレータ YSS-400】	チェック（○×）
・外観	○
・起動動作　POWER　ON時、ランプ点灯時に異常は無いか。 （異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）	○
【IV測定システム YSP-220】	
・外観	○
・起動動作　POWER　ON時に異常は無いか。 （PC立ち上げ時でのプログラム動作に問題は無いか？）	○
・IV測定システムとソーラシミュレータとの通信に問題は無いか？	○
【ステージ冷却チラー TRL108HⅡ】	
・外観	○
・起動動作　POWER　ON時に異常は無いか。	○

※エンドユーザー購入時、山下電装㈱での設備対応はしていただけます。（メーカー確認済み）

取扱説明書（有・無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　（備考欄コメント）
動作（OK・NG）

YSS－400動作確認時

ランプ点灯時

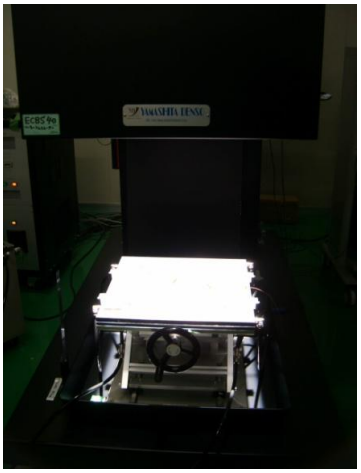

IV測定

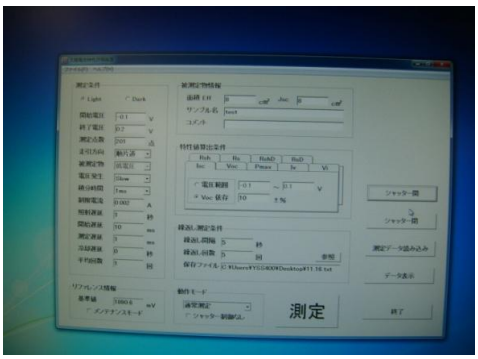

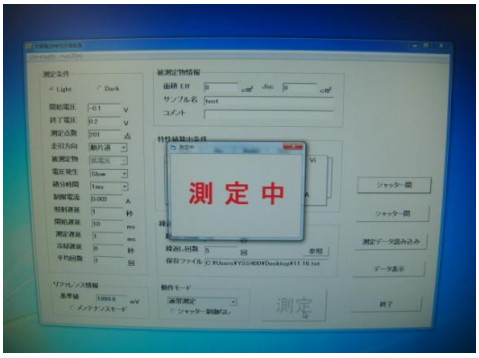

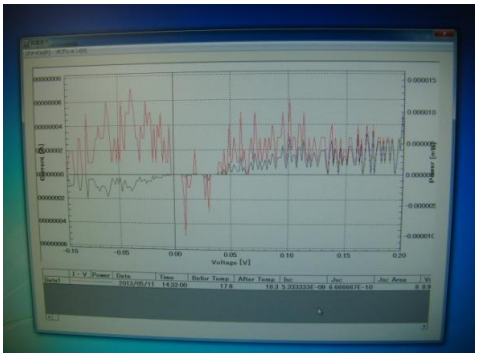

ステージ冷却機構

ランプ電源
